


AVANCEMENT DU CHANTIER

Depuis le démarrage de la phase de réhabilitation et de construction, les travaux avancent bon train. On peut déjà apercevoir depuis la rue du Sergent Blandan les niveaux supérieurs du futur centre thermal. La rénovation du patrimoine est également bien engagée. Les éléments architecturaux remarquables, dont certains inscrits aux monuments historiques, font l'objet d'une attention particulière en vue de leur mise en valeur dans le futur complexe Nancy thermal.

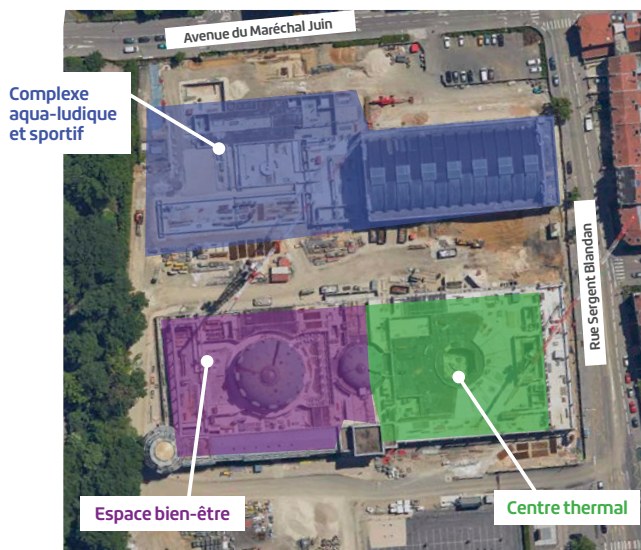

© Europe vue du ciel / Métropole du Grand Nancy

Centre thermal



Finalisé :

- Les deux étages sont édifiés, bien visibles depuis la rue Sergent Blandan.
- La construction des 3 bassins de cette zone (un multifonction, un de mobilisation et un couloir de marche dans l'eau) est également finie. Ils ont été mis en eau afin de vérifier leur étanchéité avant de pouvoir poser le carrelage.

En cours :

- La fin du gros œuvre de cette zone est prévue fin août 2021. Les premiers châssis des menuiseries extérieures, en aluminium, apparaissent. Les planchers de cette zone sont en cours de réalisation. Les corps d'états techniques (réseaux d'électricité, chauffage, ventilation, plomberie...) montent en puissance et ont commencé déjà à œuvrer au niveau du parking souterrain, sous la zone thermale.

L'espace bien-être



Finalisé :

- Les voiles (parois en béton) du rez-de-chaussée sont totalement achevées.

En cours :

- La petite rotonde est également en cours de restauration patrimoniale. Son dôme va recevoir une nouvelle couverture en zinc. Ses mosaïques et la statue surplombant la fontaine des Trois-Grâces font également l'objet d'une réfection complète. La dalle du rez-de-chaussée de l'espace bien-être est en cours de réalisation. L'ancienne piscine ronde est actuellement en restructuration : la mosaïque, entièrement déposée, est en cours de restauration.

Le complexe aqua-ludique et sportif



Finalisé :

- Les travaux d'étanchéité sur le bassin olympique sont terminés.

En cours :

- La pose du carrelage dans le bassin intérieur a démarré. L'achèvement du gros œuvre des bassins extérieurs est prévu fin octobre. Leur carrelage sera posé courant juillet. Les travaux sont en cours pour les deux futurs postes de transformation électrique.

FOCUS LES MÉTIERS DU BTP RECRUTENT

Les entreprises du BTP du département vous donnent rendez-vous en septembre à l'occasion d'un forum Emploi pour ce chantier et les autres de la région. Nombreux sont les débouchés et les opportunités de recrutement dans ce secteur... La date vous sera communiquée prochainement. Restez connectés !



Prochaines étapes

Au second trimestre 2021, le chantier connaîtra de nouvelles étapes dont une particulièrement spectaculaire. Fin août, l'une des grues va quitter le site afin de permettre l'installation de la base de montage du 3^e et nouveau dôme. Les éléments en bois qui le composent vont être en effet fabriqués dans les Vosges puis acheminés sur site afin d'être assemblés au sol. Courant septembre, le nouveau dôme ainsi construit, sera hissé et déposé à l'aide d'une grue spécifique sur le toit du nouveau centre thermal. Il viendra parachever le bâtiment imaginé par Louis Lanternier, avec respect de son œuvre, mais aussi en apportant une touche audacieuse et moderne, pour une mise en scène contemporaine des thermes historiques de Nancy.



← Nouveau dôme construit en septembre

Une question au sujet du chantier ?

Pour toute demande de renseignements en lien avec les travaux, contactez le **0 800 008 059** (service et appels gratuits)



En savoir plus sur le projet : www.grandnancythermal.fr
